

イ-ジ-ラ-メン橋施工実績


山梨県

| |
|-----------------------|
| 橋梁名: 無し (鐘山新線 忍野村歩道橋) |
| 工事名: 鐘山新線道路改良工事 (1工区) |
| 発注者: 山梨県 忍野村役場 |
| 工事受注者: 有限会社 丸山土建 |
| 竣工日: 平成 28 年 6 月 18 日 |

現場地図



橋梁一般図

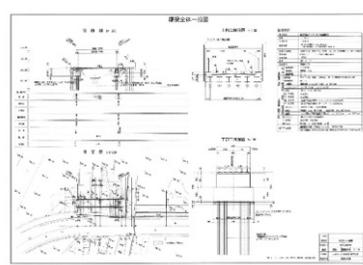

現場住所(路線名)
山梨県南都留郡忍野村忍草2807番地先

コメント
複合門型ラーメン橋 橋長 L=18.90m
橋台 2基 RC壁式
基礎杭(場所打ち) 2本*2箇所 φ1m L=6m

基礎杭の打設状況



橋台鉄筋組立状況



橋台Co打設状況



H鋼桁架設状況



桁下面型枠設置状況



桁上面鉄筋組立状況



橋体Co打設状況

施工前(Before) 正面



完成(After) 正面



施工前(Before) 側面



完成(After) 側面



| |
|-----------------------|
| ERB 施工会社: 芙蓉建設株式会社 |
| ERB 桁製作会社: 荻浦工業株式会社 |
| ERB 営業会社: エコジャパン株式会社 |
| 工法開発者: 朝日エンジニアリング株式会社 |
